

EPSI PoI Userclub – Workshop


Projekt ePoI – Entwicklungsstand und Perspektiven

03.11.26 | Abraxas Informatik AG

Agenda


1.	Neue Applikation – Generelle Punkte	2 Min.
2.	Projekt ePOL Vorgehen	2 Min.
3.	Projekt ePOL Vorgehen – Bereits umgesetzt	4 Min.
4.	Projekt ePOL Vorgehen – Aktuell in Arbeit	15 Min.
5.	Projekt ePOL Vorgehen – Geplant	7 Min.
6.	Fragen	10 Min.

Neue Applikation – Generelle Punkte
EPSI Pol wird zur Weblösung

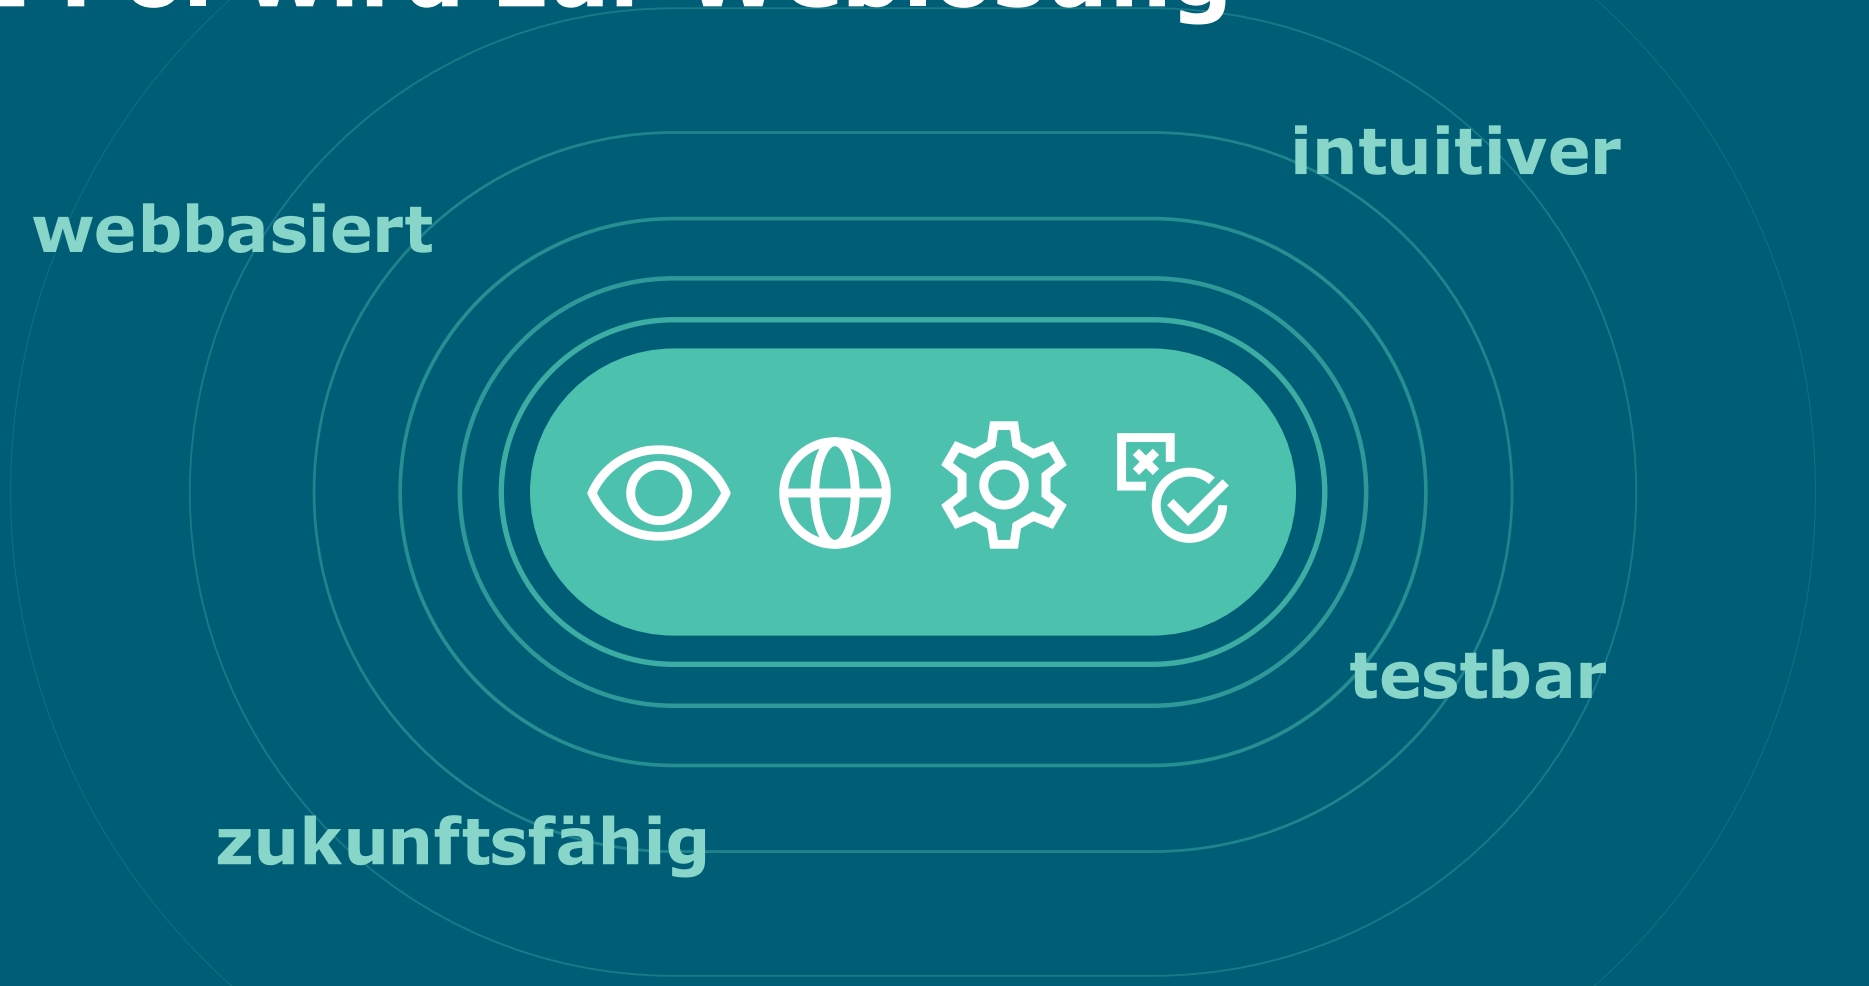

Neue Applikation – Generelle Punkte
Was wird neu gemacht?

- Die Nutzeroberfläche wird neu gemacht nach Abraxas Standard
- Framework Uniface wird abgelöst durch .NET
- Neue Technologie und somit neue Features
- Datenbank ist frei wählbar (Bedingung SQL Datenbank)
- Sinnvolle Funktionalität bleibt erhalten

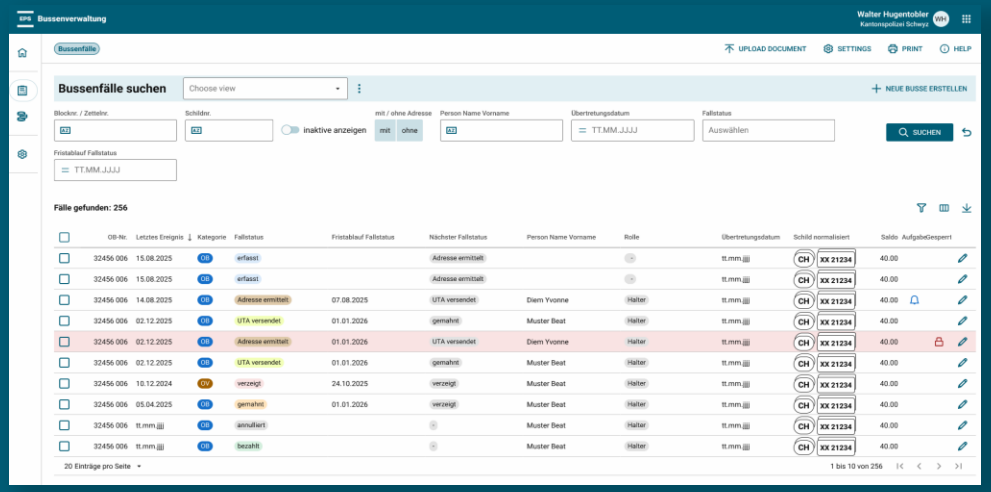

- Automatische Rückzahlungen
- Letter ID
- Blaulichtfahrten
- Usw…

Projekt ePOL Vorgehen

4

Einführung und Roll Out

Testumgebung für Kundentests bereitstellen
Einführung gemäss Rolloutplan
Schulung der Mitarbeiter

3

Realisierung Seite Abraxas

Live Demo: Einblicke ePOL
Entwicklung der Applikation
Feedback einarbeiten

Realisierung Seite Kunde

Der Kunde prüft die Geschäftsfälle mit der neuen Lösung, Einarbeitung des Kundenfeedback

2

Konzeption

Erste Entwürfe / Erstellung ePOL Prototyp / Spezifizierungen
Test System planen und aufbauen

1

Initialisierung

Ist-Situation/Analyse
Organisation Teams und Aufgaben



Projekt ePOL Vorgehen

bereits umgesetzt



4

Einführung und Roll Out

Testumgebung für Kundentests bereitstellen
Einführung gemäss Rolloutplan
Schulung der Mitarbeiter

3

Realisierung Seite Abraxas

Live Demo: Einblicke ePOL
Entwicklung der Applikation
Feedback einarbeiten

Realisierung Seite Kunde

Der Kunde prüft die Geschäftsfälle mit der neuen Lösung, Einarbeitung des Kundenfeedback

2

Konzeption


Erste Entwürfe / Erstellung ePOL Prototyp / Spezifizierungen
Test System planen und aufbauen

1


Initialisierung

Ist-Situation/Analyse
Organisation Teams und Aufgaben

Ist-Situation

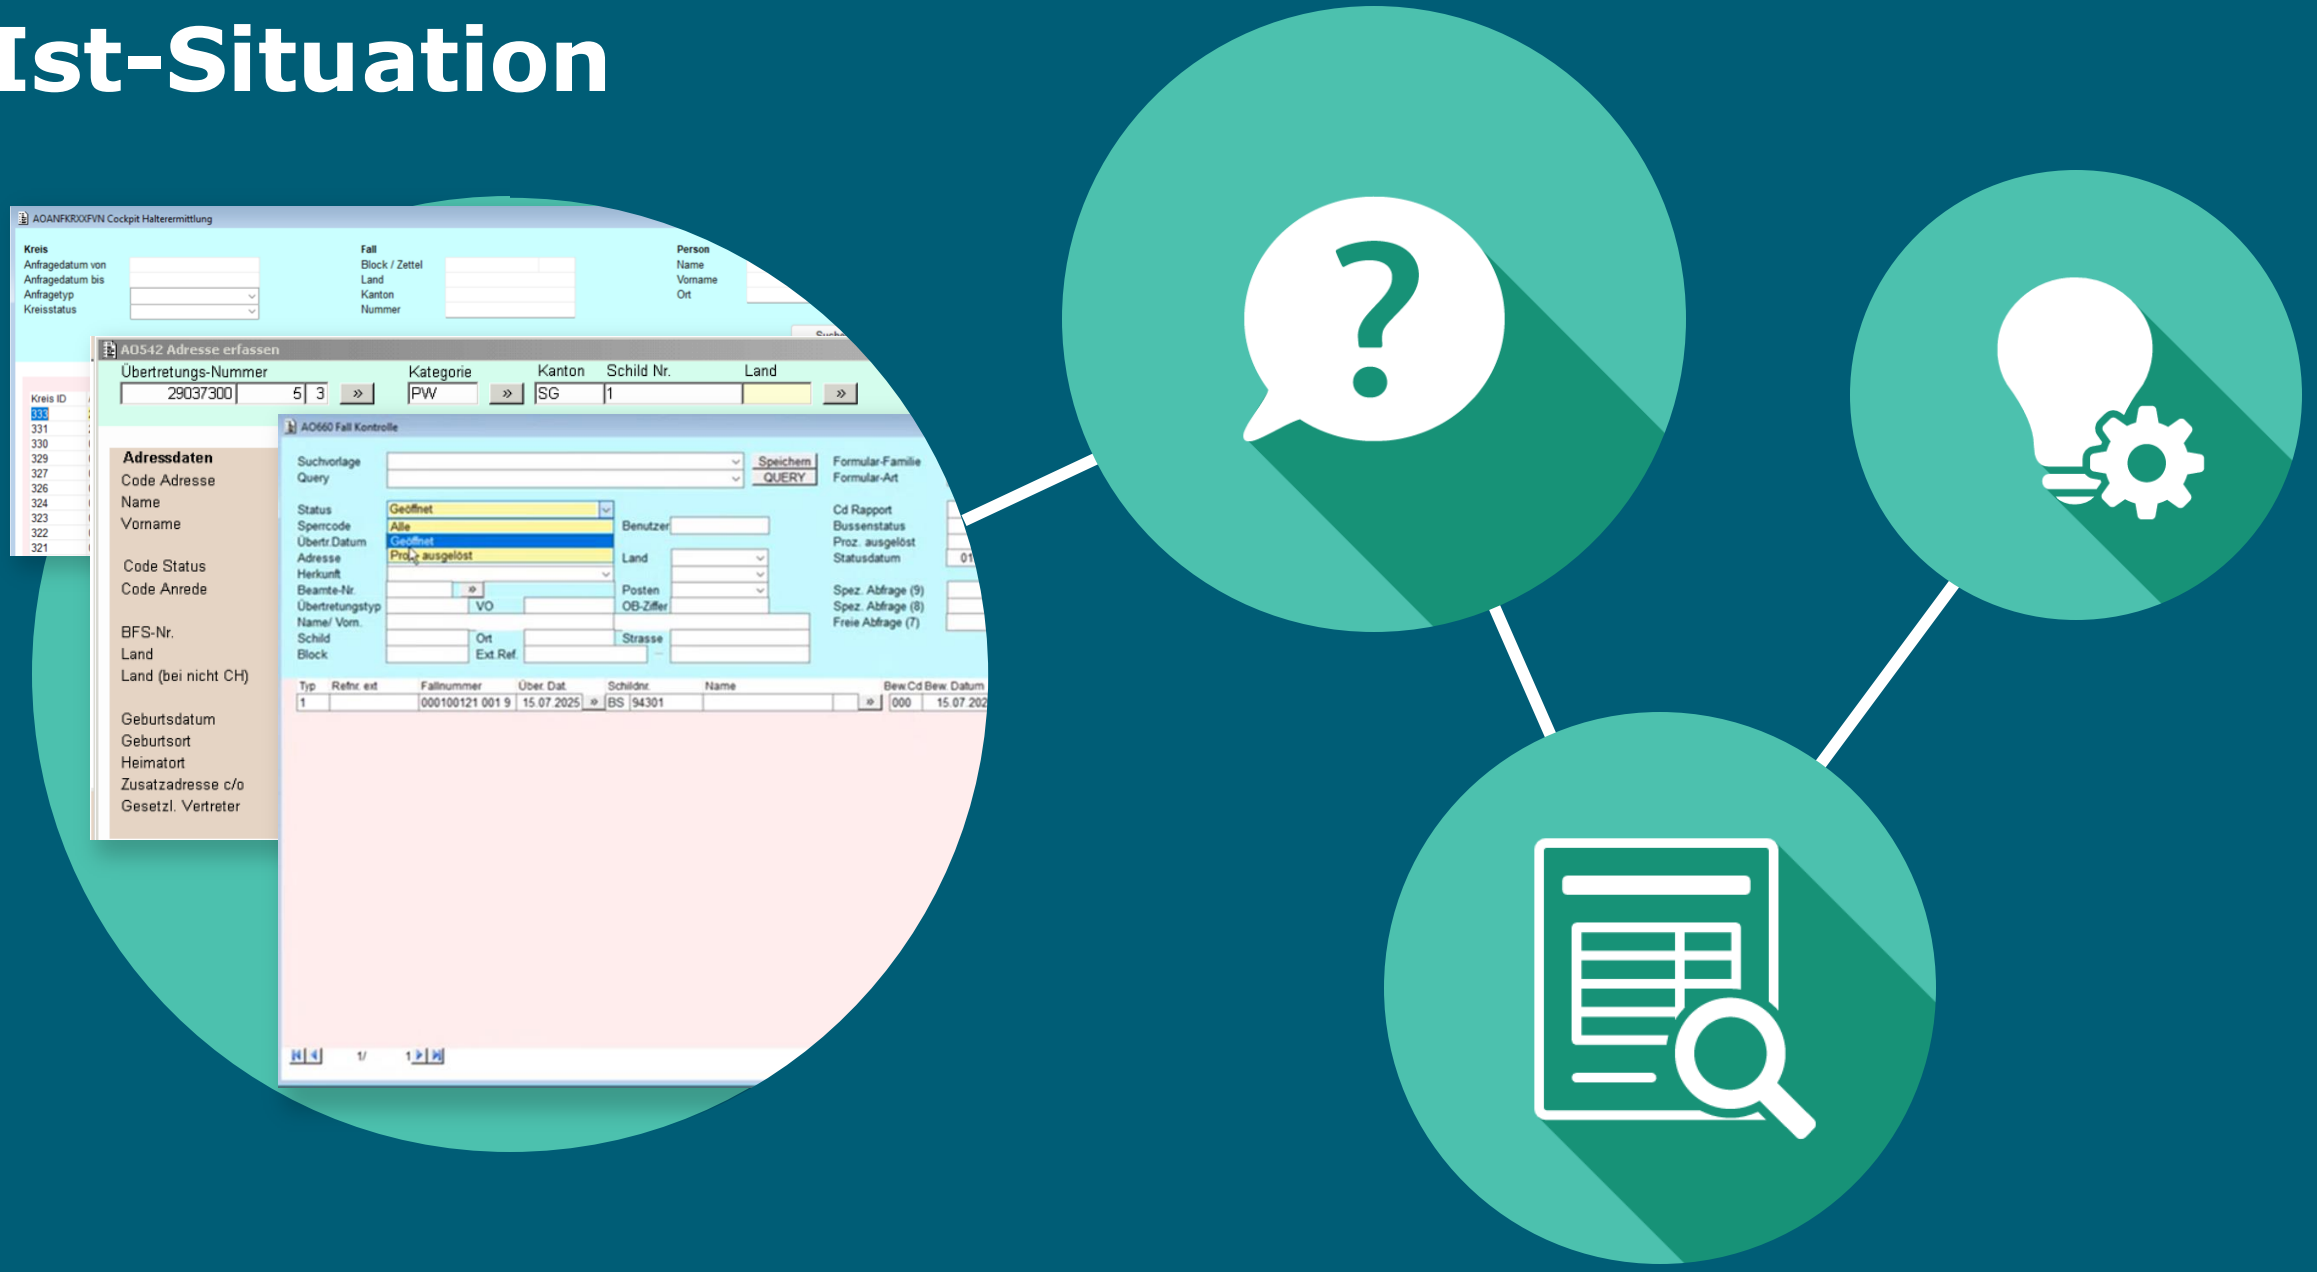

Organisation: Aufgaben

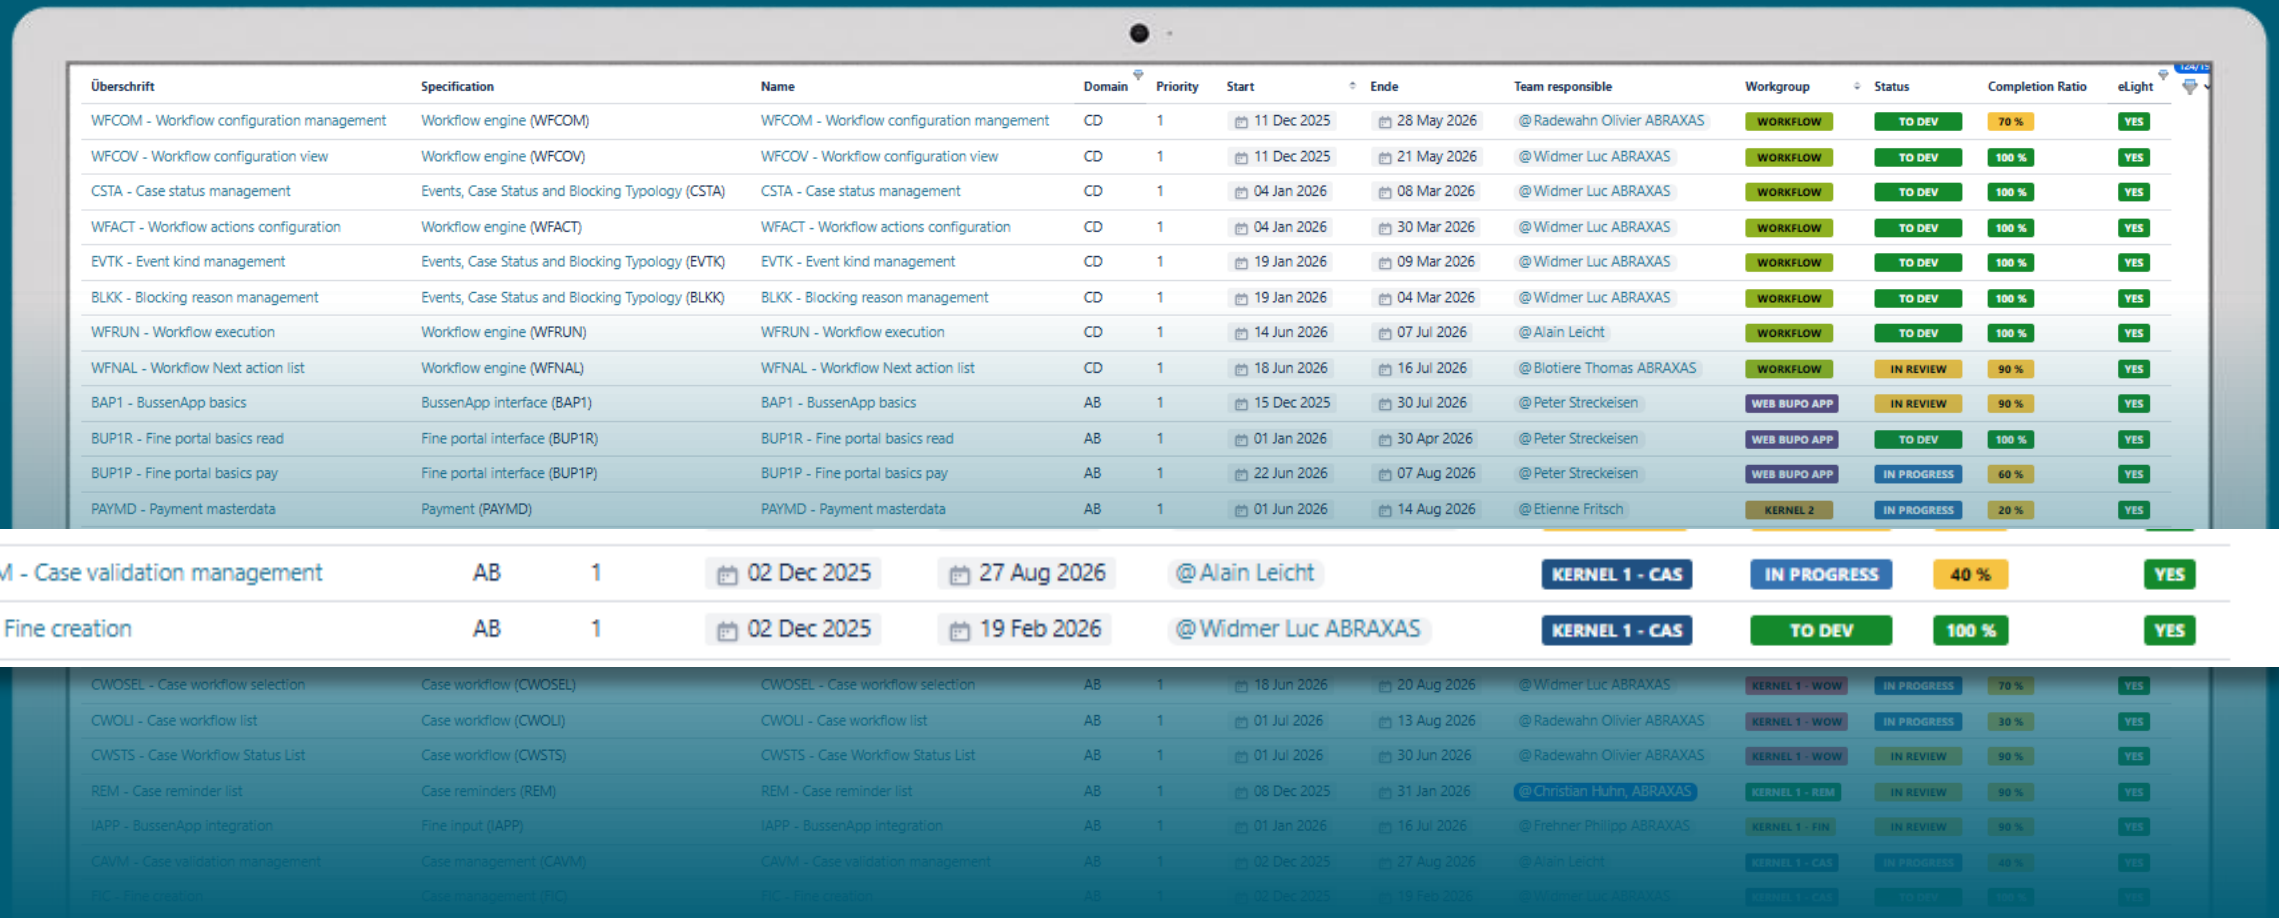

Überschrift	Specification	Name	Domain	Priority	Start	Ende	Team responsible	Workgroup	Status	Completion Ratio	eLight
WFCOM - Workflow configuration management	Workflow engine (WFCOM)	WFCOM - Workflow configuration mangement	CD	1	11 Dec 2025	28 May 2026	@Radewahn Olivier ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	70 %	YES
WFCOV - Workflow configuration view	Workflow engine (WFCOV)	WFCOV - Workflow configuration view	CD	1	11 Dec 2025	21 May 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
CSTA - Case status management	Events, Case Status and Blocking Typology (CSTA)	CSTA - Case status management	CD	1	04 Jan 2026	08 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
WFACT - Workflow actions configuration	Workflow engine (WFACT)	WFACT - Workflow actions configuration	CD	1	04 Jan 2026	30 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
EVTK - Event kind management	Events, Case Status and Blocking Typology (EVTK)	EVTK - Event kind management	CD	1	19 Jan 2026	09 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
BLKK - Blocking reason management	Events, Case Status and Blocking Typology (BLKK)	BLKK - Blocking reason management	CD	1	19 Jan 2026	04 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
WFRUN - Workflow execution	Workflow engine (WFRUN)	WFRUN - Workflow execution	CD	1	14 Jun 2026	07 Jul 2026	@Alain Leicht	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
WFNAL - Workflow Next action list	Workflow engine (WFNAL)	WFNAL - Workflow Next action list	CD	1	18 Jun 2026	16 Jul 2026	@Blotiere Thomas ABRAXAS	WORKFLOW	IN REVIEW	90 %	YES
BAP1 - BussenApp basics	BussenApp interface (BAP1)	BAP1 - BussenApp basics	AB	1	15 Dec 2025	30 Jul 2026	@Peter Streckeisen	WEB BUPO APP	IN REVIEW	90 %	YES
BUP1R - Fine portal basics read	Fine portal interface (BUP1R)	BUP1R - Fine portal basics read	AB	1	01 Jan 2026	30 Apr 2026	@Peter Streckeisen	WEB BUPO APP	TO DEV	100 %	YES
BUP1P - Fine portal basics pay	Fine portal interface (BUP1P)	BUP1P - Fine portal basics pay	AB	1	22 Jun 2026	07 Aug 2026	@Peter Streckeisen	WEB BUPO APP	IN PROGRESS	60 %	YES
PAYMD - Payment masterdata	Payment (PAYMD)	PAYMD - Payment masterdata	AB	1	01 Jun 2026	14 Aug 2026	@Etienne Fritsch	KERNEL 2	IN PROGRESS	20 %	YES
CAVM - Case validation management	AB	1	02 Dec 2025	27 Aug 2026	@Alain Leicht	KERNEL 1 - CAS	IN PROGRESS	40 %	YES		
FIC - Fine creation	AB	1	02 Dec 2025	19 Feb 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	KERNEL 1 - CAS	TO DEV	100 %	YES		

Projekt ePOL Vorgehen

Grösstenteils umgesetzt



4

Einführung und Roll Out

Testumgebung für Kundentests bereitstellen
Einführung gemäss Rolloutplan
Schulung der Mitarbeiter

3

Realisierung Seite Abraxas

Live Demo: Einblicke ePOL
Entwicklung der Applikation
Feedback einarbeiten

Realisierung Seite Kunde

Der Kunde prüft die Geschäftsfälle mit der neuen Lösung, Einarbeitung des Kundenfeedback

2

Konzeption


Erste Entwürfe / Erstellung ePOL Prototyp / Spezifizierungen
Test System planen und aufbauen

1


Initialisierung

Ist-Situation/Analyse
Organisation Teams und Aufgaben


Prototyp

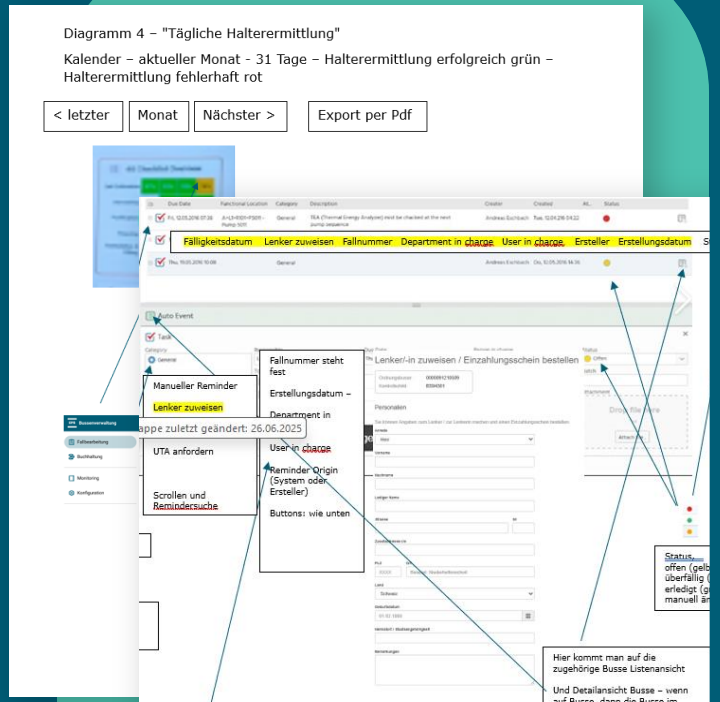

Erste Entwürfe

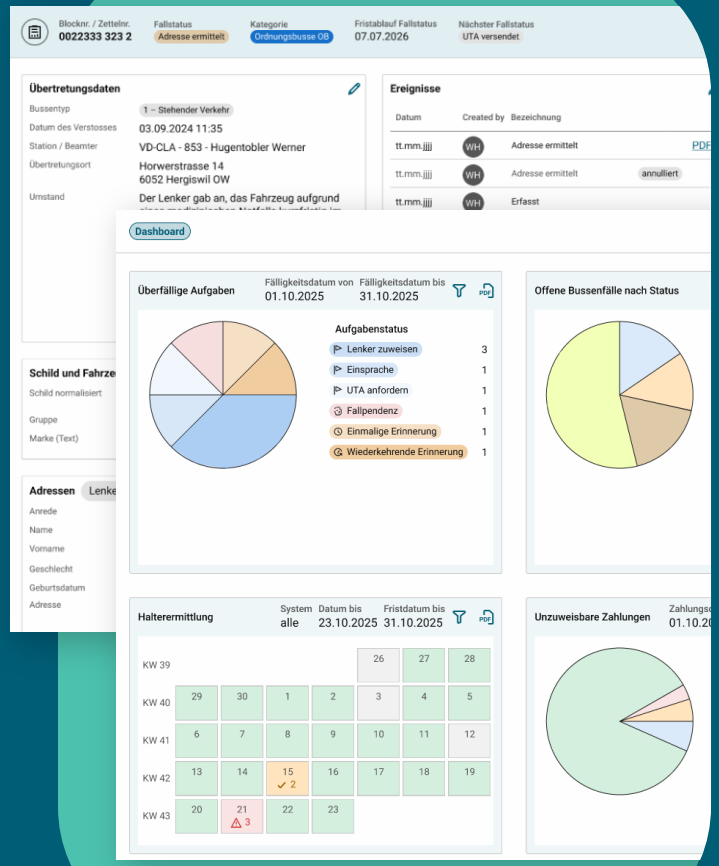


Prototyp

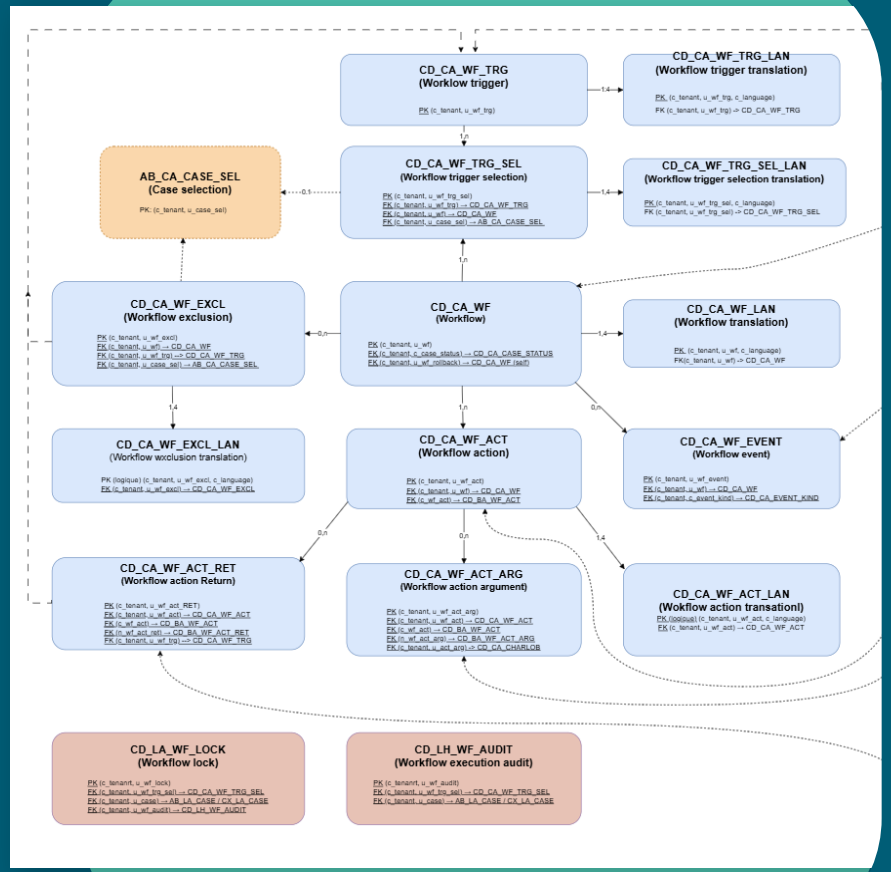


Spezifizierung


Test System planen und aufbauen

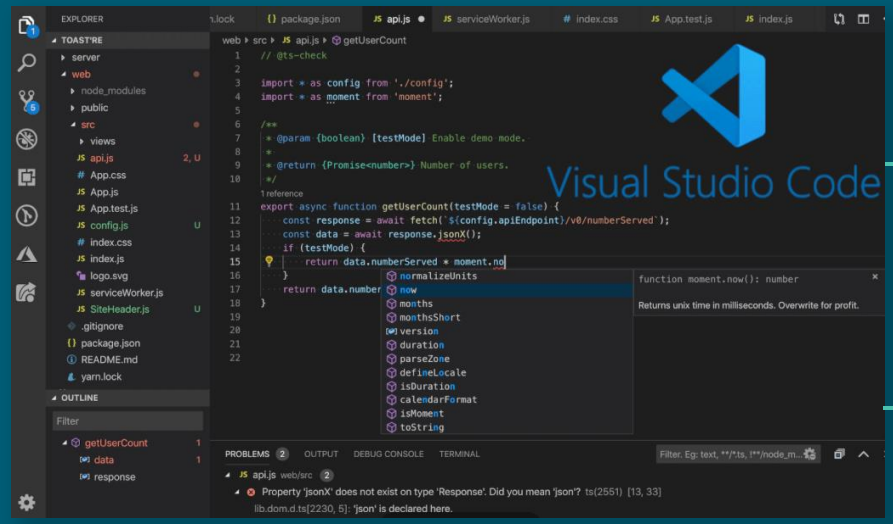



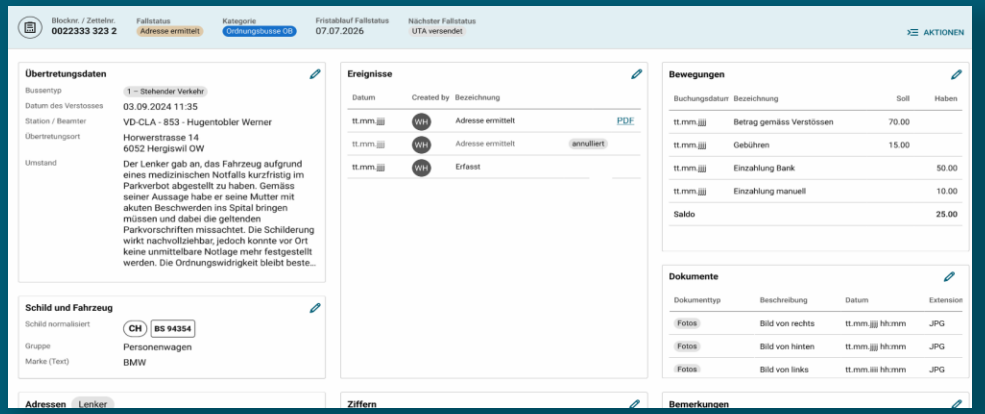





Projekt ePOL Vorgehen

Aktuell in Arbeit



4

Einführung und Roll Out

Testumgebung für Kundentests bereitstellen
Einführung gemäss Rolloutplan
Schulung der Mitarbeiter

3

Realisierung Seite Abraxas

Live Demo: Einblicke ePOL
Entwicklung der Applikation
Feedback einarbeiten

Realisierung Seite Kunde

Der Kunde prüft die Geschäftsfälle mit der neuen Lösung, Einarbeitung des Kundenfeedback

2

Konzeption

Erste Entwürfe / Erstellung ePOL Prototyp / Spezifizierungen
Test System planen und aufbauen

1


Initialisierung

Ist-Situation/Analyse
Organisation Teams und Aufgaben


Live Demo: Einblicke ePOL

abraxas

Entwicklung der Applikation

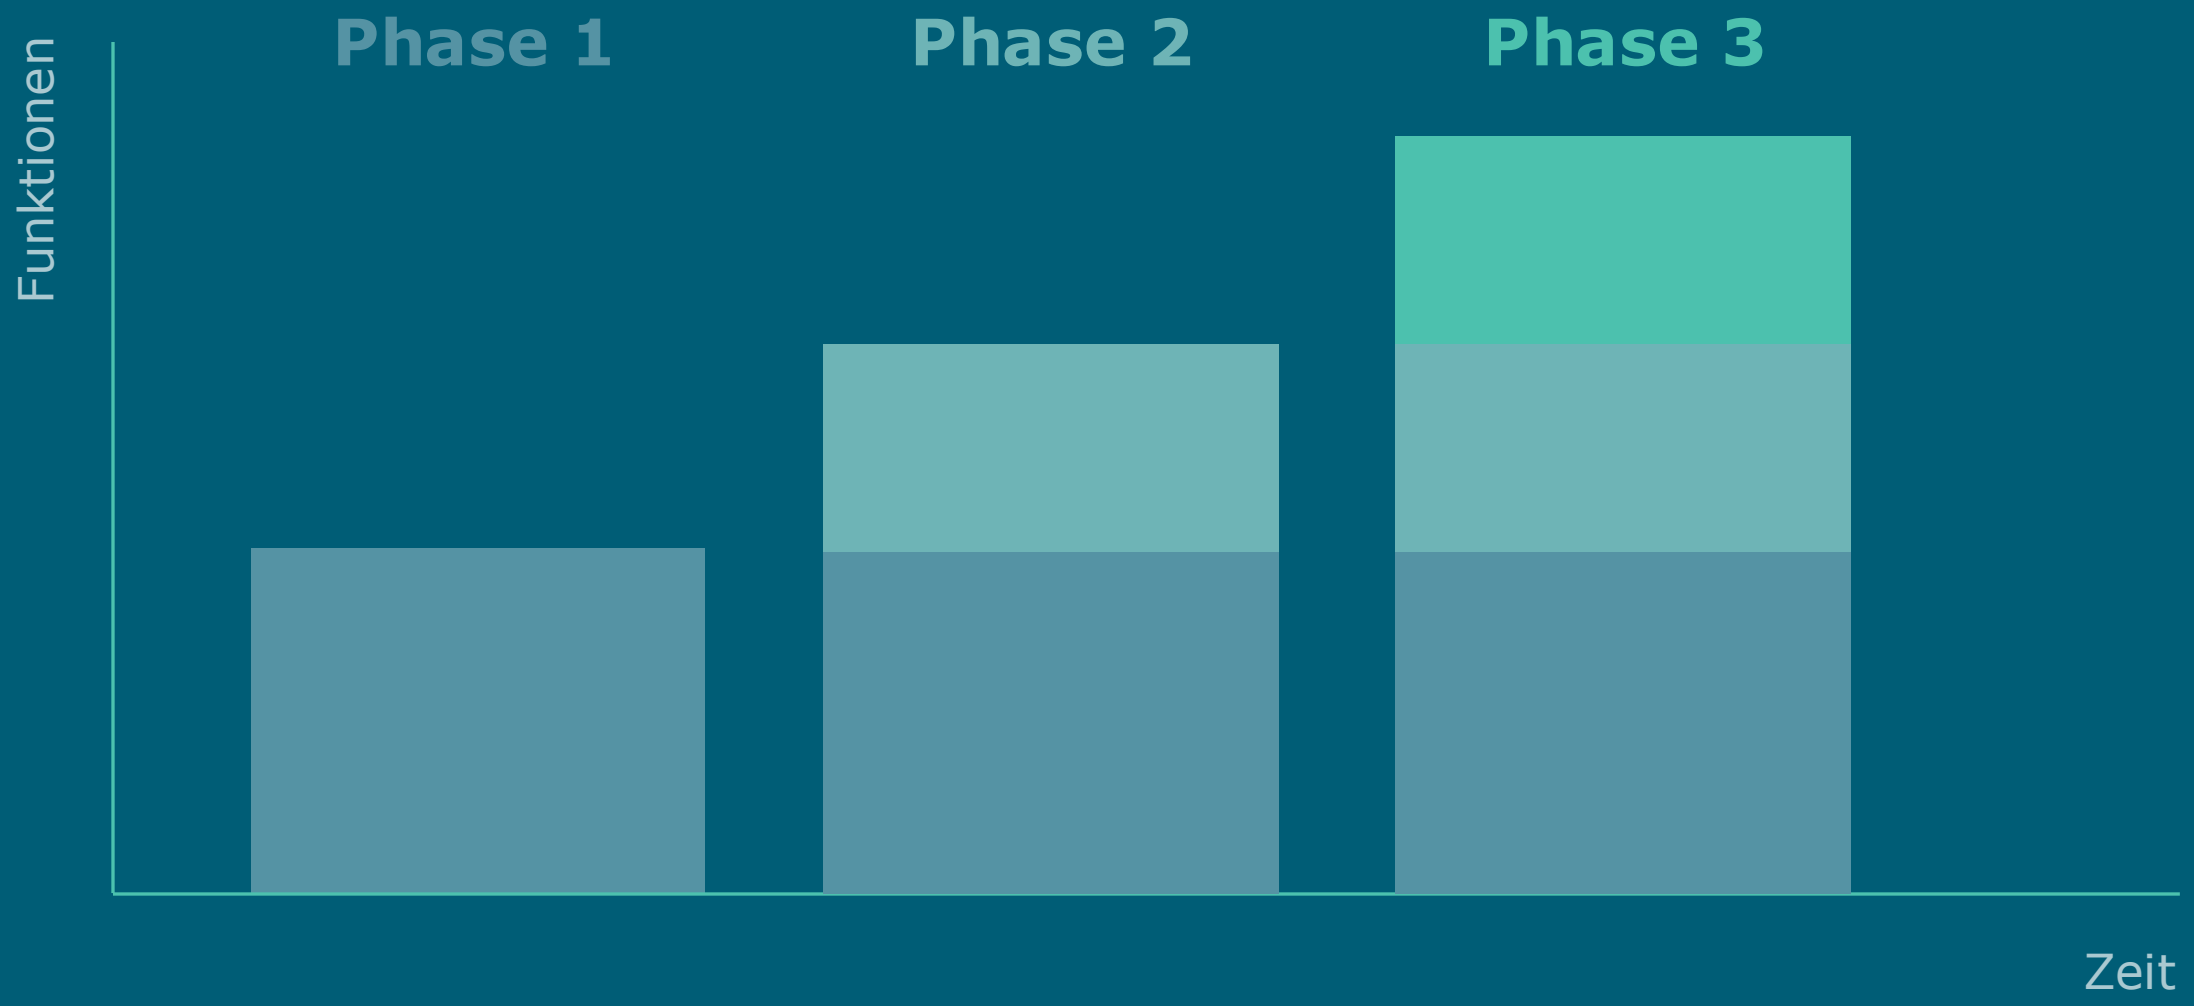

Entwicklung der Applikation

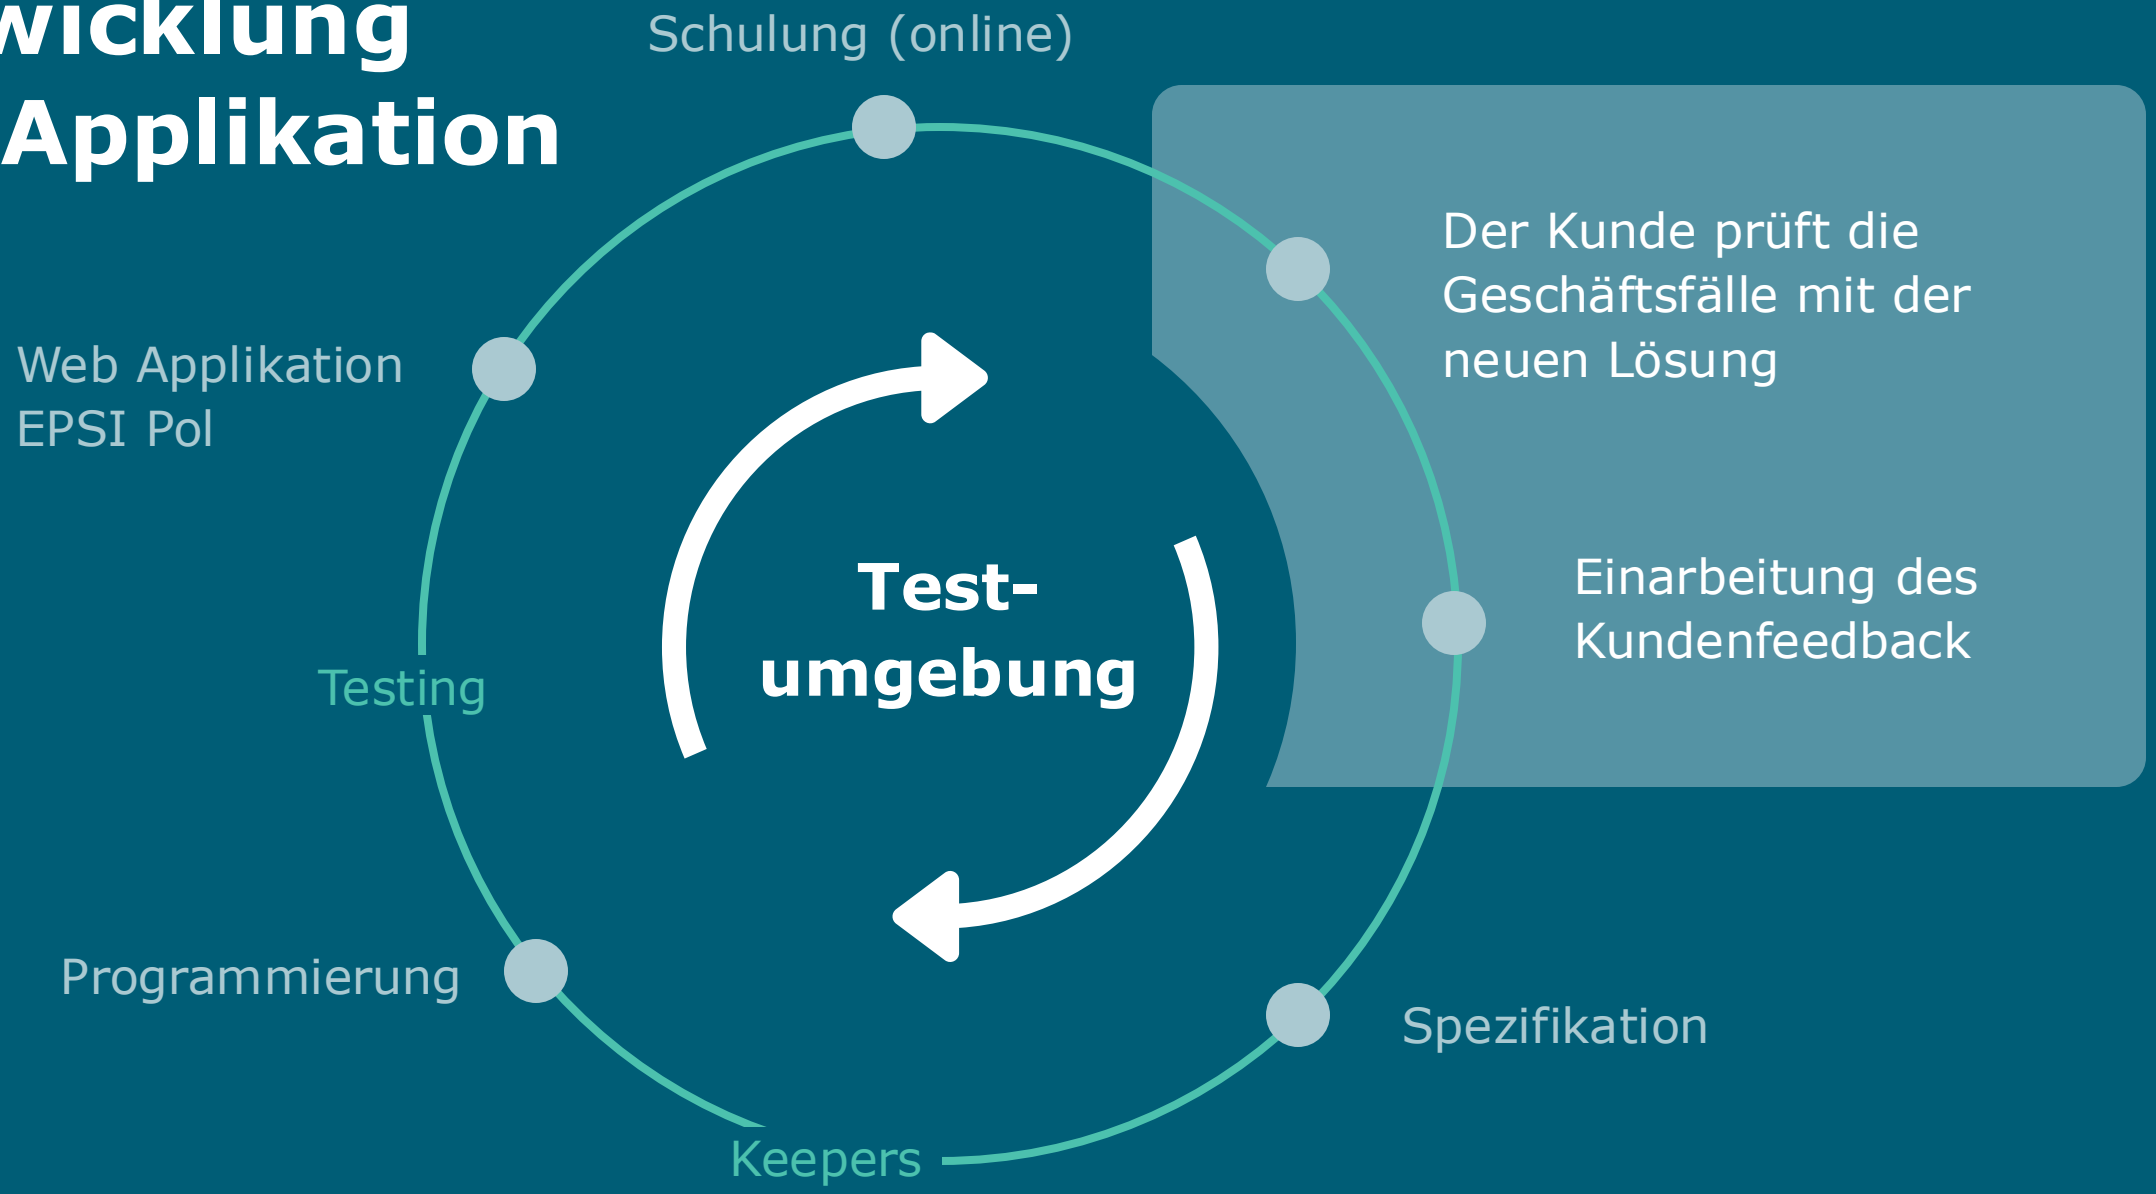

Projekt ePOL Vorgehen

Geplant

4

Einführung und Roll Out

Testumgebung für Kundentests bereitstellen
Einführung gemäss Rolloutplan
Schulung der Mitarbeiter

3

Realisierung Seite Abraxas

Live Demo: Einblicke ePOL
Entwicklung der Applikation
Feedback einarbeiten

Realisierung Seite Kunde

Der Kunde prüft die Geschäftsfälle mit der neuen Lösung, Einarbeitung des Kundenfeedback

2


Konzeption

Erste Entwürfe / Erstellung ePOL Prototyp / Spezifizierungen
Test System planen und aufbauen

1

Initialisierung

Ist-Situation/Analyse
Organisation Teams und Aufgaben

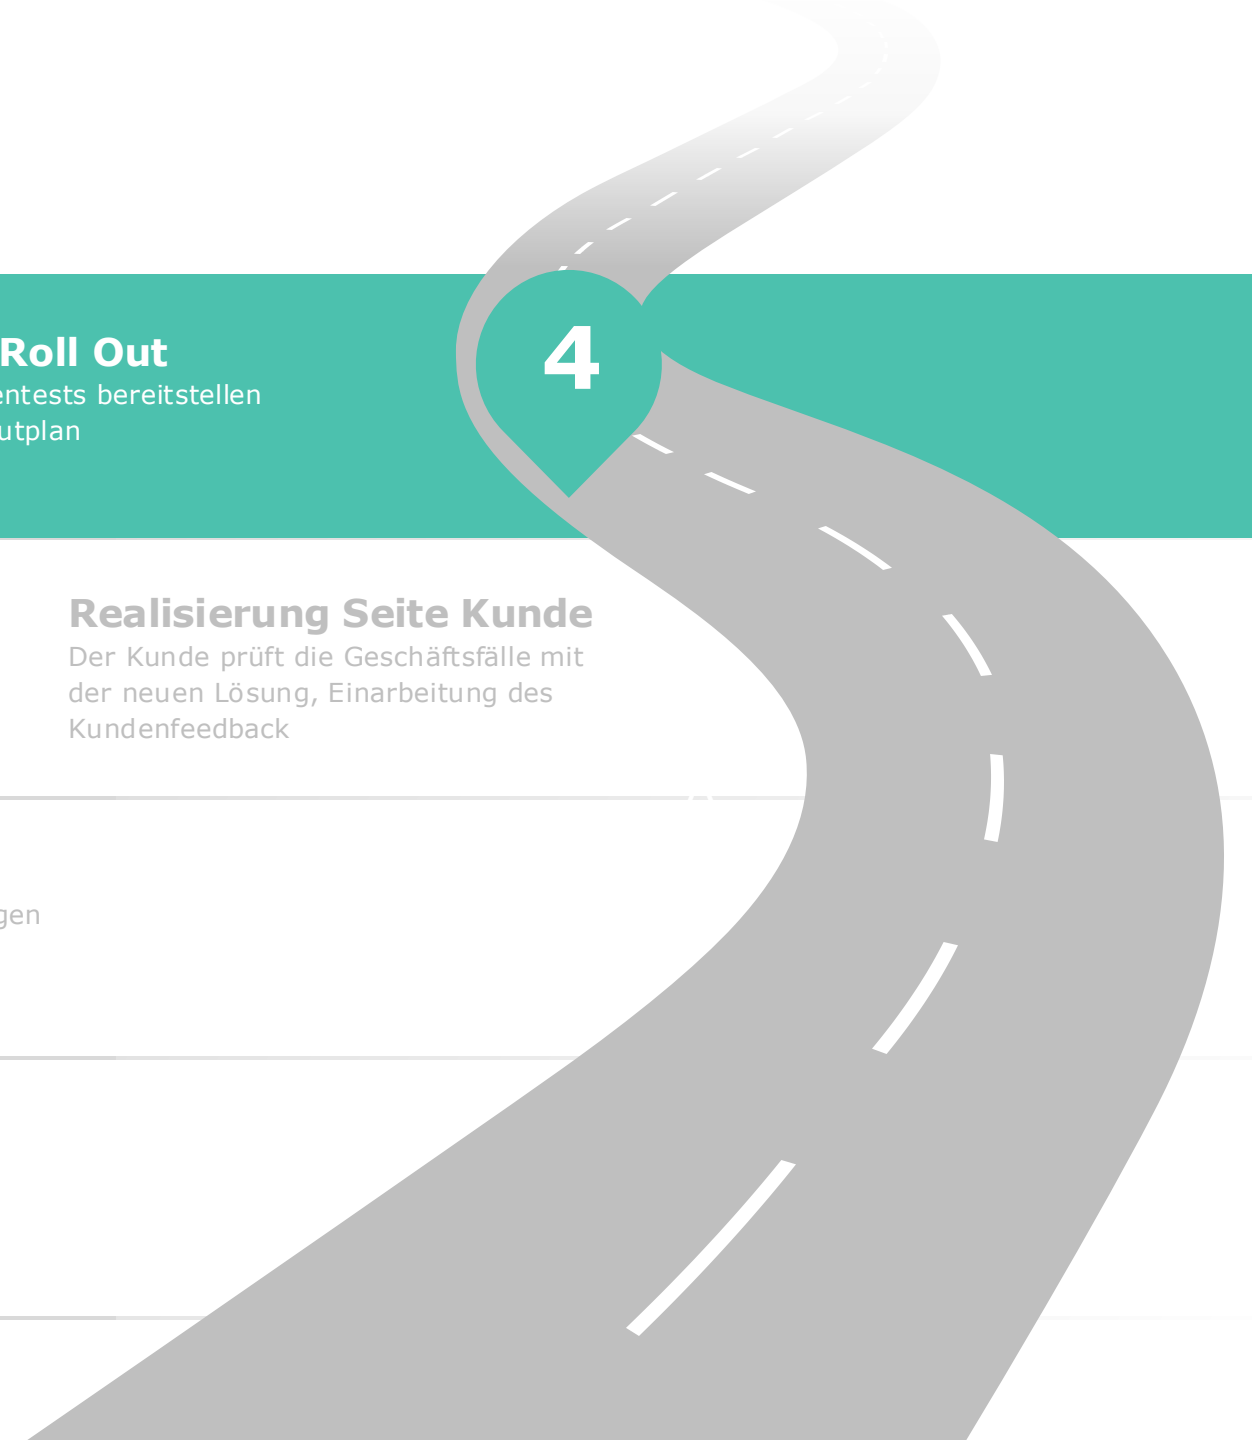

Rollout nach Funktionalität

Mitte 2027



EPSI Pol
Standardprozess Ruhender Verkehr ohne Anpassung

Phase 1

Ende 2027



EPSI Pol
Standarprozess für alle Ordnungsbussen mit erweiterten Anforderungen

Phase 2

2028



EPSI Pol
Kunden mit hoher Individualisierung

Phase 3

Gerne beantworten wir Ihre Fragen



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit
